




**REWITALIZACJA  
GMINY STRZEGOM**



WFE.0640.5.2020

**Sprawozdanie monitoringowe  
postępu realizacji  
Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Gminy Strzegom  
na lata 2015-2025**

Stan na dzień 31.12.2019r.

Zatwierdzam, 30.06.2020r. ....

**z up. BURMISTRZA**  
**Z-ca Burmistrza**  
*mgr inż. Wiesław Witkowski*

Strzegom, czerwiec 2020

Obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (zwany dalej Programem lub LPR) został przyjęty uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Treść Programu przewiduje m.in. mechanizm monitorowania postępów jego realizacji w formie sprawozdania monitorującego, sporządzanego przez Burmistrza Strzegomia, opiniowanego następnie przez Zespół ds. Rewitalizacji i przedkładanego Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Po zakończeniu 2019 roku przystąpiono do gromadzenia danych w zakresie postępu realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Programie. Pozyskane dane zestawiono w formie tabelarycznej. Na podstawie analizy zgromadzonych danych dokonano kategoryzacji projektów w zależności od stanu ich zaawansowania oraz wystąpienia ewentualnych zagrożeń ich realizacji. Projekty podzielono na 5 kategorii, którym przyporządkowano n.w. kolory:






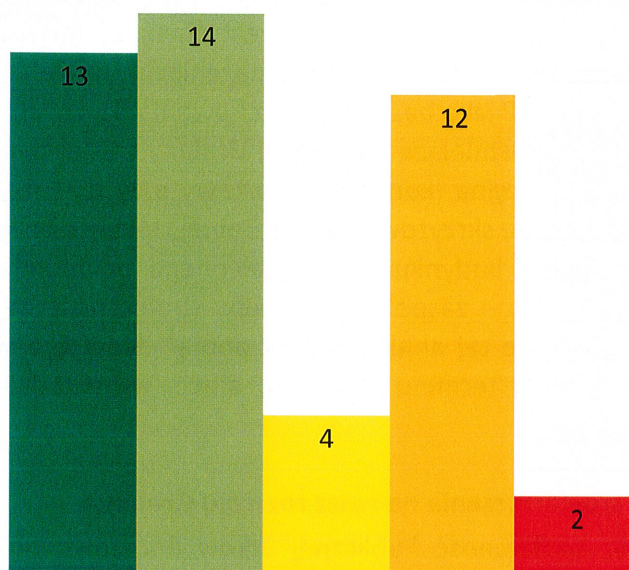
Kolor	Opis kategorii projektów
	Projekty zrealizowane
	Projekty w trakcie realizacji
	Projekty, których termin realizacji nie upłynął i nie zidentyfikowano ryzyka ich niezrealizowania
	Projekty niezrealizowane, pomimo upływu terminu ich realizacji, obarczone możliwym do przewyższenia ryzykiem ich niezrealizowania w przyszłości
	Projekty niezrealizowane w założonych terminach, których realizacja w przyszłości jest zagrożona

Tabela stanowiąca integralną część sprawozdania monitoringowego zawiera podstawowe dane na temat stopnia realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, w tym zwięzły opis stanu zaawansowania każdego z nich. W przypadku projektów niecyklicznych zakończonych dodatkowo wskazano wartość poniesionych wydatków oraz osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu (tam gdzie było możliwe ich oszacowanie na dzień 31.12.2019r.). W przypadku projektów cyklicznych uwzględniono narastające wartości wydatków na zakończone etapy projektu oraz dotychczas narastająco osiągnięte wskaźniki. Poszczególne projekty oznaczono kolorami adekwatnie do stanu ich zaawansowania.

W odniesieniu do projektów problemowych dodatkowo uwzględniono zwięzły opis przyczyn opóźnień i zidentyfikowanych ryzyk, a także podjęte lub planowane do podjęcia działania zaradcze.

Poniżej przedstawiono uproszczoną grafikę obrazującą liczbę projektów w poszczególnych kategoriach postępu ich realizacji. Zrealizowane w całości zostało 13 projektów (28,9%), w tym 4 z listy podstawowej. W trakcie realizacji jest 14 projektów (31,1%). 12 projektów (26,67%) nie zostało zrealizowanych w pierwotnie zakładanym terminie, jednakże nadal istnieje szansa na ich zakończenie w okresie obowiązywania programu. 4 projekty (8,89%) oczekują na

realizację i nie zidentyfikowano ryzyk ich wykonania w terminie. 2 projekty (4,44%) nie zostały zrealizowane, a ryzyko ich niezrealizowania w okresie obowiązywania programu jest wysokie.



Istotnym jest fakt, że spośród pięciu projektów umieszczonych na liście podstawowej projektów rewitalizacyjnych cztery zostały już zakończone. Tylko jeden z projektów, tj. **A01. Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszków w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych**, w znacznym stopniu z przyczyn niezależnych od Gminy Strzegom odpowiedzialnej za jego realizację, nie został dotychczas zrealizowany. Podjęte jednakże zostały działania dostosowawcze, tak by zmiana zasad finansowania inwestycji drogowych nie przeszkodziła w realizacji projektu. Gmina podjęła działania w celu przedłużenia ważności pozwolenia na budowę, a do budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok wprowadzone zostały środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Szczegółnej analizy wymaga 14 projektów, których nie zrealizowano, bądź istnieje znaczne ryzyko ich niezrealizowania w przyszłości. W przypadku 12 projektów oznaczonych kolorem pomarańczowym, w tabeli obrazującej postęp realizacji projektów w kolumnie uwagi zawarto opis podjętych bądź planowanych do podjęcia działań zapobiegawczych, które w szczególności umożliwią realizację projektów w kolejnych latach obowiązywania programu rewitalizacji. Dwa pozostałe projekty (wymienione poniżej) zostały oznaczone kolorem czerwonym, co oznacza, że ich realizacja jest zagrożona lub niemożliwa.

### **Projekt B07. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu.**

W 2016 nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczonych na sportową infrastrukturę przyszkolną. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Kosztowna inwestycja na ul. Jeleniogórskiej w znacznym stopniu straciła uzasadnienie, ponieważ w założeniach miała służyć w godzinach przedpołudniowych uczniom PSP jako baza zajęć wychowania fizycznego.

Konieczne jest rozważenie, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstałe place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształconego na przedszkole i żłobek) oraz wybudowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej. Dopiero na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję o wykreśleniu projektu, modyfikacji jego zakresu bądź terminu realizacji, albo wprowadzeniu innego projektu o podobnym charakterze.

### **Projekt B13. Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny.**

Projekt, zgłoszony przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, również nie został zrealizowany z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty. Istotne zmiany organizacyjne zepchnęły na dalszy plan działania niezwiązane bezpośrednio z działalnością edukacyjną szkoły. Wskazane jest ponowne rozważenie koncepcji projektu i powrót do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych, albo zachęcenie innej grupy aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.

Mając na uwadze powyższe, w obydwu przypadkach przedwczesnym wydaje się być podejmowanie decyzji o ich wykreśleniu z listy projektów rewitalizacyjnych.

Odnotowano przekroczenia pierwotnie zaplanowanych terminów realizacji części projektów, które nie są efektem zaniedbań, a raczej wynikają z przyczyn niezależnych od realizatorów projektów, np. zmiany terminów ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie i ich późnego rozstrzygnięcia, zmiany w otoczeniu prawnym i organizacyjnym, czy też konieczność uwzględniania potrzeb mieszkańców i uwarunkowań nieznanych w okresie tworzenia Programu. Z wyłączeniem dwóch projektów oznaczonych kolorem czerwonym (opisanych powyżej), należy oczekiwać, że wszystkie pozostałe projekty zostaną zrealizowane w okresie obowiązywania Programu. W chwili obecnej nie jest zasadnym dokonywanie zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów, ponieważ w krótkim okresie mogą być one elementem motywującym do sprawnego podjęcia działań w celu realizacji projektu.

Uwzględniając zgromadzone dane o stanie zaawansowania projektów dokonano analizy wskaźników monitoringowych dla poszczególnych celów Programu. Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki, dla których odnotowano na dzień 31.12.2019r. oczekiwany trend (wzrost).

Wskaźnik	Oczekiwana zmiana
<b>Cel 1. Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz stanu środowiska naturalnego</b>	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	wzrost
Liczba zabytków poddanych renowacji [szt.]	wzrost
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt.]	wzrost
Powierzchnia zrewitalizowanych i zagospodarowanych terenów zielonych [ha]	wzrost
<b>Cel 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców i integracja społeczności lokalnej</b>	
Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.]	wzrost
Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp.[szt.]	wzrost
Liczba zainstalowanych kamer [szt.]	wzrost
Liczba wyposażonych obiektów publicznych [szt.]	wzrost
Liczba nowo wybudowanych budynków służących integracji i działalności kulturalnej i społecznej [szt.]	wzrost
Liczba utworzonych mieszkań socjalnych [szt.]	wzrost
Liczba nowo utworzonych organizacji pozarządowych [szt.]	wzrost
Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp.	wzrost
<b>Cel 3. Rozwój gospodarczy i poprawa dostępności komunikacyjnej</b>	
Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	wzrost
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m kw.]	wzrost
Długość utworzonych dróg rowerowych [km]	wzrost
Liczba słupów oświetleniowych [szt.]	wzrost
Liczba spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców	wzrost

Stopień realizacji wskaźników jest zależny od stopnia zaawansowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przy ocenie trendu uwzględniono wskaźniki zrealizowane w ramach zakończonych projektów niecyklicznych oraz w ramach zakończonych etapów i edycji projektów cyklicznych i realizowanych etapami.

Ocena stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów pozwala stwierdzić, że osiągnięto wzrostowy trend wszystkich wskaźników monitoringowych, z wyłączeniem wskaźnika dot. nowo utworzonych organizacji pozarządowych, związanego z wyżej opisywanym projektem B13. Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny.

#### Ocena stopnia realizacji Programu

Na podstawie analizy zgromadzonych danych o stanie zaawansowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy stwierdzić, że Program jest realizowany w sposób prawidłowy z nieznacznymi odchyleniami od pierwotnie zaplanowanych terminów. Zrealizowano bądź rozpoczęto realizację 60% projektów, a jedynie w odniesieniu do 2 spośród 45 projektów zidentyfikowano poważne ryzyko ich niewykonania.

#### Rekomendacje:

1. Brak konieczności ponowienia w 2020 roku naboru projektów rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do Programu.

Uzasadnienie:

Projekty zaplanowane pierwotnie realizują zaplanowane cele rewitalizacji. Dla każdego celu odnotowano oczekiwany wzrost wszystkich bądź większości przypisanych im wskaźników monitoringowych. Obecnie należy skupić się na skutecznej realizacji pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

**2. Brak konieczności wykreślenia w 2020 roku projektów rewitalizacyjnych umieszczonych w LPR.**

Uzasadnienie:

Przyczyną wykreślenia projektu może być co prawda opóźnienie terminu realizacji, wystąpienie istotnych zagrożeń realizacji czy też zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu, jednakże wykreślanie projektów w 2020 roku jest przedwczesne. Należy zintensyfikować działania odnośnie projektów, których realizacja jest opóźniona w stosunku do pierwotnie planowanych terminów oraz dokonać analizy 2 projektów, dla których zidentyfikowano ryzyko ich niewykonania.

Odnośnie projektu **B07. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu** konieczne jest rozważenie w kolejnych latach, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstające place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształconego na przedszkole i żłobek) oraz wybudowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej. Dopiero na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję o wykreśleniu, modyfikacji bądź wprowadzeniu innego projektu.

Odnośnie projektu **B13. Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny**, należy w porozumieniu z jego wnioskodawcą ponownie rozważyć jego koncepcję i powrócić do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych, bądź zachęcić inną grupę aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.

**Z uwagi na wprowadzony w marcu 2020r. stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii COVID-19, uwzględniając zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz innych instytucji, negatywnie wpływające na zaplanowany harmonogram prac nad sprawozdaniem, a także mając na celu ograniczenie ryzyka narażenia członków Zespołu ds. Rewitalizacji na zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2, podjęto decyzję o niezwoływaniu posiedzenia Zespołu w celu zaopiniowania „Sprawozdania monitoringowego postępu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. Stan na dzień 31.12.2019r.”. Sprawozdanie zostanie złożone Radzie Miejskiej w Strzegomiu w terminie do 30.06.2020r. i przekazane członkom Zespołu w formie elektronicznej.**

Sprawozdanie przygotował:

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Funduszy Europejskich  
*mgr Marek Flakowski*

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZAWARTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025

Stan na dzień 31.12.2019r.

## A. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – lista podstawowa (A)

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot Realizujący	Pod-obszar rewitalizacji	Szacowana wartość PLN	Termin realizacji	Zwięzły opis stanu zaawansowania na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik produktu szacowany/zrealizowany	Wskaźnik rezultatu szacowany/zrealizowany	Całkowite wydatki projektu zakończonych PLN	Uwagi, w tym istotne zmiany mogące naruszać pierwotny cel projektu, uzasadnienie nieosiągnięcia wskaźników
A01	Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jarosłów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	Gmina Strzegom	Jarosłów	1 000 000,00	2018	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrzne. Decyzja pozwolenia na budowę ważna do dnia 28.09.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,3 / - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,4 / -	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/-	Nie dotyczy	Z uwagi na zmiany zasad dofinansowania inwestycji drogowych trudno pozyskać dofinansowanie dla projektu, ponieważ nie spełnia on wymagań technicznych określonych w regulaminach konkursu (zbyt wąski pas drogowy, sąsiedztwo obiektu zabytkowego). Podjęte zostały działania zmierzające do przedłużenia ważności posiadanej pozwolenia na budowę. Wprowadzono środki finansowe na realizację inwestycji do budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok
A02	Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ul. Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego	Gmina Strzegom	Miasto i Grabina Strzegom – Stare	1 000 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m <sup>2</sup> ] 820 / 1487,47 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,9 / 0,91	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/1	3 219 141,02	Projekt zakończony
A03	Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej	Gmina Strzegom	Miasto i Grabina Strzegom – Stare	500 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,18 / 0,198 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,65 / 0,78	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/1	4 609 564,73	Projekt zakończony
A04	Zagospodarowanie parku miejskiego i terenów przywleżych od ul. Świdnickiej do ul. Kasztelarskiej.	Gmina Strzegom	Miasto i Grabina Strzegom – Stare	3 000 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,28 / 0,30 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,9 / 0,95	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/1	4 609 564,73	Projekt zakończony
A05	Renowacja zabytkowych murów obronnych w rejonie parku od ul. Dolnej do ul. Kasztelarskiej.	Gmina Strzegom	Miasto i Grabina Strzegom – Stare	450 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1/1	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1/1	1 516 734,50	Projekt zakończony

B. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – lista uzupełniająca (B)

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Pod-obszar rewitalizacji	Planowany termin realizacji	Zwięzły opis stanu zaawansowania na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik produktu szacowany/zrealizowany	Wskaźnik rezultatu szacowany/zrealizowany	Całkowite wydatki projektu zakończonych PLN	Uwagi, w tym istotne zmiany mogące naruszać plenowny cel projektu, uzasadnienie nieosiągnięcia wskaźników
B01.	Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brzegowej	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2020	Gmina posiada „Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Strzegom”, który ma na celu połączenie istniejących i mających powstać wkrótce ścieżek rowerowych w funkcjonalną całość. Dokument ten nie jest elementem projektu rewitalizacyjnego, jednakże stwarza podstawę do działań ujętych w tym projekcie w kolejnych latach.	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,7 km / -	Liczba osób korzystających z drogi rowerowej [os./rok] 500/ -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B02.	Przebudowa ulicy Krótkiej i ulicy Parkowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrzne. Pozwolenie na budowę w zakresie działek innych niż kolejowa ważne do dnia 3.03.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg grminnych [km] 0,6 / - Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 7/ -	Nośność drogi Kni/os 80/ -	Nie dotyczy	Z uwagi na fakt postępującego zagospodarowania terenów wokół planowanej przebudowy, a także mając na uwadze plany odwodnienia ul. Widokowej, zaistniała konieczność ponownego rozważenia zakresu i rozwiązań technicznych dla przebudowywanej drogi. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zaprojektowaniu i wykonaniu odwodnienia, którego budowa będzie wymagała ingerencji w nawierzchnię i infrastrukturę podziemną ul Parkowej. Nie wyklucza to możliwości realizacji projektu w okresie obowiązywania programu rewitalizacji.
B03.	Przebudowa chodników i oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 374 w Strzegomiu w ciągu ul Kasztelańskiej	Gmina Strzegom, Dohnańska i Kołwe Wrocławiu	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016	Projekt zakończony. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano między innymi chodniki z kostki betonowej, zjazdy z kostki kamiennej i betonowej, obrzeża betonowe oraz krawężniki. Wykonano również energooszczędne oświetlenie LED (słup-wysięgnik-oprawa)	Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m2] 2424 / 2 124,45 Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 17/ 17	Nośność drogi Kni/os 115 / 80	577 706,84	Projekt zakończony Wystąpiły nieznaczne różnice wskaźników osiągniętych w porównaniu z zaplanowanymi. Nie miały one jednak wpływu na osiągnięcie celu projektu.
B04.	Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016 etap I 2018 etap II	Zakończony I etap projektu. W ramach zrealizowanego etapu I wykonany został chodnik i schody z kostki granitowej wraz z obrzeżami.	Powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej [m.2] 12 / 57,90 Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 5 / -	Zwiększenie dostępności do obiektów publicznych [szt.] 1/ 1	Nie dotyczy	Zrealizowano etap I, nie przewidziano w projekcie budżetu na 2019 rok środków finansowych na realizację etapu II. Tymczasowo wstrzymano dokończenie inwestycji z uwagi na konieczność ulokowania w tej rejonie boksów śmieciowych dla okolicznych budynków mieszkalnych oraz zapewnienia dojazdu pojazdu odbierającego odpady.



B05.	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Strzegomiu wraz z terenem przyległym	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2017	<p>Wymagana jest aktualizacja dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie prac możliwe będzie po jej wykonaniu. Wyłoniono wykonawcę nowej dokumentacji. Procedura pozyskania pozwolenia na budowę uległa wydłużeniu w związku z obowiązkiem uzyskania ZRID, wynikającym z konieczności uregulowania własności działek niezgodnych pod przebudowę.</p>	Powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej [m2] 585 / -	Nośność drogi Kn/os 80/ -	Nie dotyczy	Po zatwierdzeniu nowej dokumentacji możliwa będzie realizacja inwestycji.
B06.	Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016	<p>Projekt zrealizowany. W ramach projektu zamontowane zostały 4 komplety szybkobrotowych kamer oraz stanowisko stacyjne. Kamery zamontowano na skrzyżowaniu ulic: Rynek – Paderewskiego Rynek – Kościuszki Rynek – Świdnicka Plac zabaw przy ul. Czerwonego Krzyża</p>	Liczba zainstalowanych kamer [szt.] 3/ 4	Spadek rocznej liczby przestępstw rewitalizowanym 10/ będzie badany w okresie późniejszym	149 282,70	Projekt zakończony
B07.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	<p>Wnioskowano o dofinansowanie projektu ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w 2016 roku. Projekt został pozytywnie oceniony, nie uzyskał jednak dofinansowania. Dokumentacja techniczna utraciła ważność w 2018 roku.</p>	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.] 1/ 0	Liczba beneficjentów [os.] 100/ 0	Nie dotyczy	<p>W 2016 nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków MSiT przeznaczonych na sportową infrastrukturę szkolną. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Kosztowna inwestycja na ul. Jeleniogórskiej straciła sens, ponieważ w założeniach miała służyć w godzinach przedpołudniowych uczniom PSP jako baza zajęć WF.</p> <p>Konieczne jest rozważenie, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstałe place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształcanego na przedszkole i tobolek) oraz wybudowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej.</p>
B08.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	<p>Uwzględniono jako jeden z elementów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.</p>	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt.] 1/ 1	Oszczędność energii końcowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u. GJ/rok 2730 / 2731,68	1 512 314,05	Projekt zakończony
B09.	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	<p>Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, przewidywany termin zakończenia dokumentacji – II półrocze 2020r.</p>	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,4 / -	Nośność drogi Kn/os 80/ -	Nie dotyczy	Pomimo upływu terminu realizacji nadal istnieje możliwość wykonania przebudowy drogi, z uwagi na nowe możliwości finansowania jakie zapewnia rządowy program „Fundusz Drog Samorządowych”. W tym celu opracowywana jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

B10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej	Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Brak budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej ze względu na brak ujęcia inwestycji w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodno Kanalizacyjnych Spółki WIK. W związku z pojawieniem się możliwości finansowania przebudowy dróg gminnych z planowanego do uruchomienia w 2019 roku „Funduszu Dróg Samorządowych” – rozważone zostanie również wykonanie infrastruktury komunalnej pod planowaną drogą.	Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] 0,5 / - Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km] 0,5 / -	Liczba przyłączy [szt.] 10/ -	Nie dotyczy	Pomimo upływu terminu realizacji nadal istnieje możliwość wykonania przebudowy ul. Malinowej, z uwagi na nowe możliwości finansowania jakie zapewnia rządowy program „Fundusz Dróg Samorządowych”. W przypadku podjęcia przebudowy drogi – dokonana zostanie analiza infrastruktury komunalnej w rejonie przebudowy.
B11.	Miejsca mi bliskie – Strzegom, Grabina, Szkoła	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	06.2017	Zrealizowano w okresie wrzesień 2016-czerwiec 2017 działania, dzięki którym uczniowie poznali historię Strzegomia, dzielnicy Graby i szkoły. Rozbudzili poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu poprzez odkrywanie walorów kulturowych, historycznych i krajoznawczych z uwzględnieniem rysu demograficznego dzielnicy Graby: 1) konkurs fotograficzny „Moja najbliższa okolica”, 2) gazetka ścienna dotycząca historii i współczesności, 3) konkurs na prezentację multimedialną dot. ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i bogactw naturalnych, 4) wywiady z najstarszymi mieszkańcami Grabiny, 5) Warsztaty plastyczno-historyczno-muzealne pt. „Przyszłość mojego miasta”, 6) Opracowanie prezentacji multimedialnej na podstawie kronik szkolnych.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. [szt.] 1 / 6	Liczba beneficjentów [os.] 100/ 100	500,00 zł	Projekt zakończony
B12.	Sportowy Festyn Rodzinny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	Projekt cykliczny od 2017 roku	O odbyły się trzy edycje projektu: w roku 2017, 2018, 2019. Planowana jest coroczna kontynuacja działań	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów (rocznie) [os.] 150/ 150	1 500,00 zł rocznie	Realizacja cykliczna bez zakłóceń

B13.	Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabną	06.2017	Projekt nie został zrealizowany, w związku ze zmianami organizacyjnymi, w tym zmianą lokalizacji PSP nr 3, spowodowanymi wdrożeniem reformy oświaty	Liczba nowo utworzonych organizacji pozarządowych [szt.] 1 / -	Liczba członków stowarzyszenia [os.] 20 / - (założyciele) + mieszkańcy gminy	Nie dotyczy	Projekt został zgłoszony przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji szkoły, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Istotne zmiany organizacyjne zepchnęły na dalszy plan działania niezwiązane bezpośrednio z działalnością edukacyjną szkoły. Wskazane jest ponowne rozważenie koncepcji projektu i powrót do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych lub zachęcenie innej grupy aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.
B14.	Familijne kino rowerowe pod chmurką	Stowarzyszenie Centrum Kultury Jarosławskiej w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabną	Projekt cykliczny od 2019 roku	Projekt w fazie koncepcji	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. rocznie [szt.] 2 / -	Liczba beneficjentów (rocznie) [os.] 100/ -	Nie dotyczy	Realizacja projektu nie została podjęta w 2019 roku, jednakże dokonano analizy możliwości technicznych organizacji kina plenerowego na skwerze w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej, Wafbrzyńskiej i Jeleniogórskiej. Planowane jest zorganizowanie pokazów filmowych w okresie letnim 2020 roku.
B15.	Turniej Sołectw Strzegom-Jarosław	Rada Sołectwa Sołectwa Strzegom we Jarosławiu, lokalnymi organizacjami	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabną i Jarosław	Projekt cykliczny od 2017 roku	O odbyły się dwie edycje wydarzeń w 2017 i 2018 roku.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. (rocznie) [szt.] 1/ 1	Liczba beneficjentów [os.] 100/ 100	0,00	W roku 2019 nie odbył się turniej, jednakże mieszkańcy obu obszarów rewitalizacji mieli okazję spotkać się m.in. podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz podczas organizacji strzegomskiej Wigilii dla mieszkańców miasta i gminy.
B16.	Świetlice opiekuńczo-wychowawcze „Akcja” nowym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabną i Jarosław	Projekt cykliczny Strzegom od 2017, Jarosław od 2020	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Graby” funkcjonowała od 17 stycznia do 31 lipca 2017 r. W dni powszednie tj. od wtorku do piątku (4 dni w tygodniu) po 4 godziny dziennie. Łącznie odbyło się 109 dni z zajęciami świetlicowymi, w których średnio udział brało ok. 20 dzieci.  Łączne wydatki ok. 16,5 tys. zł.  W 2017r., 2018r. i 2019r. w PSP nr 3 realizowane było zadanie pn. „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach szkolnych” – prowadzenie tych zajęć kosztowało łącznie ok. 5,7 tys. zł.  W zakresie zajęć w Jarosławiu – projekt w fazie koncepcji.	Liczba zorganizowanych świetlic [szt.] 2/ 1	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 20-40 / 20	22 200,00	Dotychczas częściowo zrealizowano projekt w zakresie organizacji świetlicy na Grabach. Wskutek reformy oświaty i przeniesienia siedziby szkoły podstawowej na ul. Brzegową - zawieszono działalność świetlicy. Alternatywnie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne w PSP nr 3 organizowane przez inną organizację pozarządową. Projekt w zakresie świetlicy w Jarosławiu obecnie jest w fazie koncepcji, a wdrożenie tego etapu przewiduje się w 2020 roku.

B17.	<p>Poprawa jakości nauczania na każdym etapie edukacji w placówkach oświatowych na obszarach rewitalizacji.</p>	<p>Gmina Strzegom Placówki oświatowe położone na obszarach rewitalizacji. Organizacje pozarządowe wspierające szkoły.</p>	<p>Jaroszów, Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabną</p>	<p>2016-2023 (realizacja wieloletapowa w miarę pojawiania się źródeł dofinansowania)</p>	<p>W okresie IX/2016-VII/2018 zrealizowano etap I tj. skierowany m.in. do uczniów PSP nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu i w ZSP w Jaroszowie (PSP i Gimnazjum), projekt: „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najwyższych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wydatki: 302 539,13 zł Liczba godzin zajęć lekcyjnych: 4980 h Liczba beneficjentów: 241 uczniów + 5 nauczycieli W 2019 roku rozpoczęto realizację dofinansowanego ze środków EFS projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Projektem zostały objęte m.in. PSP nr 3 i PSP w Jaroszowie. W okresie IX-XII 2019 zrealizowano 182 godziny zajęć w PSP w Jaroszowie i 104 godziny zajęć w PSP nr 3. Łączne wydatki w 2019 roku – 80 293,46 zł Liczba beneficjentów: 66 uczniów + 5 nauczycieli</p>	<p>Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych (h/rok) <b>2016-2018: 100 / 2490</b> <b>2019: 100 / 286</b></p>	<p>Liczba beneficjentów w okresie rewitalizacji [os.] <b>500 / będzie badana w późniejszym terminie</b></p>	<p>382 832,59</p>	<p>Projekt realizowany etapami, w miarę pozyskiwania kolejnych środków zewnętrznych</p>
B18.	<p>Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniące funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95</p>	<p>Gmina Strzegom</p>	<p>Jaroszów</p>	<p>2016</p>	<p>Zrealizowano projekt w 2016 roku (wykonano zaplanowany remont lokalu, a następnie go wyposażono w niezbędne meble i urządzenia). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku</p>	<p>Liczba wyposazonych obiektów publicznych [szt.] <b>1/1</b></p>	<p>Liczba beneficjentów w okresie rewitalizacji [os.] <b>500 / będzie badany w późniejszym terminie</b></p>	<p>89 363,34</p>	<p>Projekt zakończony</p>

B19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jarosławie	Gmina Strzegom	Jarosław	2018	Uwzględniono jako jeden z elementów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 1 / 1	Oszczędność energii końcowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u GJ/rok 718/695,4	805 302,70	Nieznaczna różnica w wartości wskaźnika rezultatu wynika z konieczności zastosowania innych technologii niż pierwotnie wskazane w programie funkcjonalno- użytkowym, a wynikających z zaleceń konserwatora zabrytek odnośnie technologii docieplenia frontowej ściany budynku. Zmiana wskaźnika nie wpływa negatywnie na osiągnięcie celu projektu.
B20.	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jarosław	Gmina Strzegom	Jarosław	2019	Uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Liczba nowo wybudowanych budynków służących integracji i działalności kulturalnej i społecznej [szt.] 1 / 1	Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.] 1/1	4 637 914,82	Projekt zakończony
B21.	Przebudowa budynku komunalnego na mieszkanie socjalne – Jarosław 142 tzw. „Hotele”	Gmina Strzegom	Jarosław	2019	Pożyczono dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych. Odbiór nastąpił dnia 15.10.2018r.	Liczba utworzonych mieszkań socjalnych [szt.] 20 / 21	Liczba osób zamieszkujących odnowione budynki mieszkalne [szt.] 30/ będzie badany w późniejszym terminie	2 563 579,47	Projekt zakończony
B22.	Zagospodarowanie terenu zielonego działki nr 215 w Jarosławie na cele rekreacyjno-integracyjne mieszkańców wsi.	Gmina Strzegom	Jarosław	2020	Opracowano projekt budowlany. Zadanie realizowane etapami dotychczas wykonano parking wraz ze zjazdem z mieszanki mineralnej ograniczony obrzeżami kamiennymi (finansowanie z Funduszu Sołeckiego).	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,3 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 500/ -	Nie dotyczy	Projekt realizowany etapami. Zrealizowano dotychczas kluczowe elementy z punktu widzenia funkcjonalności terenu – tj. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Pozostałe elementy (w tym parking i ogrodzenie) będą realizowane sukcesywnie.
B23.	Przebudowa drogi na działkach nr 457/1 i 457/2 w Jarosławie	Gmina Strzegom	Jarosław	2017	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Złożenie robót budowlanych ważne do dnia 07.03.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,4 / ...	Nośność drogi Kn/ós 80 / ...	Nie dotyczy	Z uwagi na zmiany zasad dofinansowania inwestycji drogowych trudno pozyskać dofinansowanie dla inwestycji drogowych, ponieważ nie spełnia ona wymagań technicznych określonych w regulaminach konkursu (zbyt wąski pas drogowy). Nadal będą poszukiwane źródła finansowania projektu. W tym celu podjęto działania zmierzające do przedłużenia ważności posiadanego pozwolenia na budowę.
B24.	Przebudowa drogi na działkach nr 447 i 448 w Jarosławie	Gmina Strzegom	Jarosław	2019	Projekt w fazie koncepcji	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,1 / ...	Nośność drogi Kn/ós 100/ ...	Nie dotyczy	Pomimo upływu terminu realizacji nadal istnieją możliwości wykonania przebudowy drogi, z uwagi na nowe możliwości finansowania jakie zapewnia rządowy program „Fundusz Dróg Samorządowych”. Ostateczne decyzje w sprawie podjęcia przebudowy nastąpią na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszeżego w związku z uruchomieniem w rejonie drogi budynku wielofunkcyjnego (projekt B20 - świetlica, klub seniora, remiza strażacka) i nowego terenu rekreacyjnego (projekt B22)

B25.	Festyn Świętojański w Jarosławie	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Jarosławie	Jarosław	Projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się 3 edycje festynu (2017, 2018, 2019). Orientacyjny koszt 6000 zł (przy wydanej pracy wolontariuszy). Rokrocznie bierze udział ok. 500 os.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 500/ 500	Ok. 6 000,00 zł rocznie	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B26.	„Festyn Rodzinny Mama, Tata i ja”	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarosławie	Jarosław	projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się kolejne edycje festynu w latach 2017, 2018, 2019	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów [os.] 500/ 1000	15 042,25	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B27.	Projekt ekologiczny „Młodzi Jarosławianie dbają o klimat	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarosławie	Jarosław	Miesiące 09.-10. i 04.-06. od 2017r. (projekt cykliczny)	Odbyły się kolejne edycje projektu w latach 2017, 2018	Liczba projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie rewitalizacji [szt.] 7 / 7	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 50/ 50	0,00	Projekt realizowany bezkosztowo. Zakończono realizację projektu w 2018 roku.
B28.	Jarosławski Marszobieg Przejajowy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarosławie	Jarosław	Projekt cykliczny od 2016 roku	Odbyły się kolejne edycje marszobiegu w latach 2016, 2017, 2018, 2019	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. Rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów [os.] 300/ 300	10 137,41	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B29.	Jarosławskie Graffiti-Murale	Jarosławskie „Razem dla organizacji i współpracy” w Jarosławie	Jarosław	Projekt cykliczny od 2017 roku	Projekt nie został dotychczas rozpoczęty	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. Rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 10/ -	Nie dotyczy	Konieczna jest ponowna analiza wykonalności projektu i źródeł jego finansowania oraz uzyskanie deklaracji wnioskodawców projektu o woli jego realizacji.
B30.	Kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych we wsi Jarosław	Rada Sołecka wsi Jarosław	Jarosław	Projekt cykliczny od 2017 roku	W 2017 i 2018 roku przekazano do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu informacje o planowanych na kolejny rok kalendarzowy wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i we wsi Jarosław, które następnie trafiają do ogólnogminnego kalendarza wydarzeń	Liczba opublikowanych kalendarzy wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych rocznie [os.] 1 / 1	Liczba beneficjentów imprez rocznie [os.] 500/ 500	0,00 zł	Realizacja cykliczna bez zakłóceń i bezkosztowo poprzez przekazywanie danych o terminach i tematyce wydarzeń kulturalnych do Kalendarza Najważniejszych Wydarzeń Gminy Strzegom, publikowanego na stronie internetowej Gminy Strzegom.
B31.	Konkurs w zakresie estetyki budynków, ogrodzeń, zagrod i ogrodów	Rada Sołecka w Jarosławie w partnerswie z innymi organizacjami wsi	Jarosław	Projekt cykliczny od 2017 roku	Projekt nie został zrealizowany	Liczba konkursów rocznie [szt.] 1 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 10/ -	Nie dotyczy	Konieczna jest ponowna analiza wykonalności projektu i źródeł jego finansowania oraz uzyskanie deklaracji wnioskodawców projektu o woli jego realizacji.
B32.	Nasadzenie drzew i krzewów w rejonie granicznym obszaru wsi ze składowiskiem odpadów	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Jarosław i Rusko w współpracy z innymi organizacjami i grupami wsi	Jarosław	2017	Projekt zrealizowano w znacznie ograniczonym zakresie i nie miał formy wydarzenia ogólnowiejskiego.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. Rocznie [szt.] 1 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 30/ -	0,00	Istnieje możliwość jego kontynuacji, ponieważ społeczność wsi ma możliwość pozyskania sadzonek drzew od przedsiębiorcy prowadzącego składowisko odpadów

B33.	Remont elewacji kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Parafia Rz.Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2019	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Z powodu braku dofinansowania projekt przelożony na rok 2021. Planuje się wnioskowanie o dotację do MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Strzegom.	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Odnowiony o zabezpieczeniu przed zniszczeniem obiekt [szt.] 1 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu. Projekt rozpoczęty, gotowy do dalszej realizacji, którą warunkuje uzyskanie dofinansowania.
B34.	Remont muru okalającego kościół św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Parafia Rz.Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2021	W fazie koncepcji	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Odnowiony i zabezpieczony przed zniszczeniem obiekt [szt.] 1 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B35.	Remont gotyckiej wieży kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Parafia Rz. Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2020	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Z powodu braku dofinansowania projekt przelożony na rok 2021. Planuje się wnioskowanie o dotację do MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Strzegom.	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Liczba osób odwiedzających konserwacji i/lub restauracji obiekty [os./rok.] 500 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu. Projekt rozpoczęty, gotowy do dalszej realizacji, którą warunkuje uzyskanie dofinansowania.
B36.	Zagospodarowa nie terenu wokół kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie na cele integracji społecznej mieszkańców	Parafia Rz.Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2022	Opracowano projekt, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek w 2017 r. do LGD lecz nie uzyskał wsparcia. Planuje się ponowne złożenie wniosku do LGD w 2020r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem dla Jarosława	Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej [ha] 0,15 / -	Liczba osób korzystających z wytworzonych/zmo dernizowanych obiektów [os.] 500 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B37.	Zagospodarowa nie terenu na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych w Jarosławie	Parafia Rz Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2022	Opracowano projekt, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek w 2017 r. do LGD lecz nie uzyskał wsparcia. Planuje się ponowne złożenie wniosku do LGD, jeżeli zostanie ogłoszony adekwatny tematycznie nabór wniosków.	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.] 3 / -	Liczba osób korzystających z wytworzonych/zmo dernizowanych obiektów sportowych [os.] 200 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B38	Centrum Interwencji Kryzysowej w Jarosławie	Osrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu	Jarosław	Od 2020	Projekt w fazie koncepcji	Liczba utworzonych centów interwencji [szt.] 1 / -	Liczba osób korzystających z usług [os.] 200 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu

B39	Rowerem przez Strzegom	Gmina Strzegom we współpracy z NGO	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2020	Opracowano „Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Strzegom”, który ma na celu połączenie istniejących i mających powstać wkrótce ścieżek rowerowych w funkcjonalną całość. Dokument ten nie jest elementem projektu rewitalizacyjnego, jednakże stwarza podstawę do działań ujętych w tym projekcie w kolejnych latach.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych [szt.] 1/ -	Liczba uczestników [os.] 50/ -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B40	Wsparcie rozwoju przedsiębiorców ości na obszarach rewitalizacji	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina, Jarosław	Projekt cykliczny od 2016 roku	Począwszy od 2016 roku, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu, firmy doradcze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siłakiem Granitu”) organizowane są szkolenia, warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą (2016 – 2, 2017 – 3, 2018 – 4, 2019 – 3)	Liczba spotkań informacyjnych rocznie [szt.] 1 / 3	Liczba uczestników rocznie [os.] 40/ 40	0,00	Realizacja cykliczna bez zakłóceń. Zadanie realizowane bezkosztowo
